

亀山市防災情報伝達システム整備工事の進捗状況報告及び
 整備方針(機材配備数)の一部変更について

亀山市防災情報伝達システム整備事業につきましては、令和6年5月に改訂しました現整備方針に基づき、整備工事等を進めています。

工事の進捗状況につきましては、昨年10月から整備工事に着手しており、現在は避難発令判断システムや防災アプリの開発を進めるとともに、土砂災害等の災害リスクの高い孤立の恐れのある地域5か所へのデジタルスピーカーの設置工事、システム設備の基礎となる架台や配線、アンテナ等の設置を進めているところです。

そのような中、令和6年度には市内で4回、消防団の出動を伴う家屋火災等が発生しており、火災現場での消防団による消火活動や消火指揮等において、更なる情報指揮伝達の迅速化を図るために防災行政無線(移動系)の増設が必要であると認識したところです。

現整備方針において、防災行政無線(移動系)は、災害対策本部へ18台(消防団本部への7台含む)及び消防車両への32台を配備することとしておりますが、現場での消防活動等の更なる情報指揮伝達の迅速化を図るため、12地区の消防分団及び女性消防団へ各1台ずつ追加で配備するとともに、情報連携の強化を図るため災害対策本部へも2台追加で配備するべく、防災情報伝達システム整備方針を一部変更いたします。

今後も、令和8年4月からのシステム運用開始に向けて、市民の皆様には防災アプリへの加入促進や無線機の使用法、事業内容等を丁寧にご説明しながら進めてまいります。

【変更箇所】

亀山市防災情報伝達システム整備方針(令和6年5月改訂版)5ページ上段の表中
 防災行政無線(移動系)の台数を変更……15台を追加配備

 防災行政無線(移動系)	災害対策本部の運用	18局		20局
	消防団	32局		45局


【変更後の防災行政無線(移動系)65台の内訳】

災害対策本部(消防団本部7台含む)20台(2台を追加)・消防分団及び女性分団13台(13台を追加)・消防団車両積載32台


※防災行政無線(移動系)の15台追加配備に係る財源については、既決予算内で対応し、充当率100%、交付税措置率70%の緊急防災・減災事業債を活用します。

亀山市防災情報伝達システム整備事業 業務工程表 (概要)


R7.5.31現在

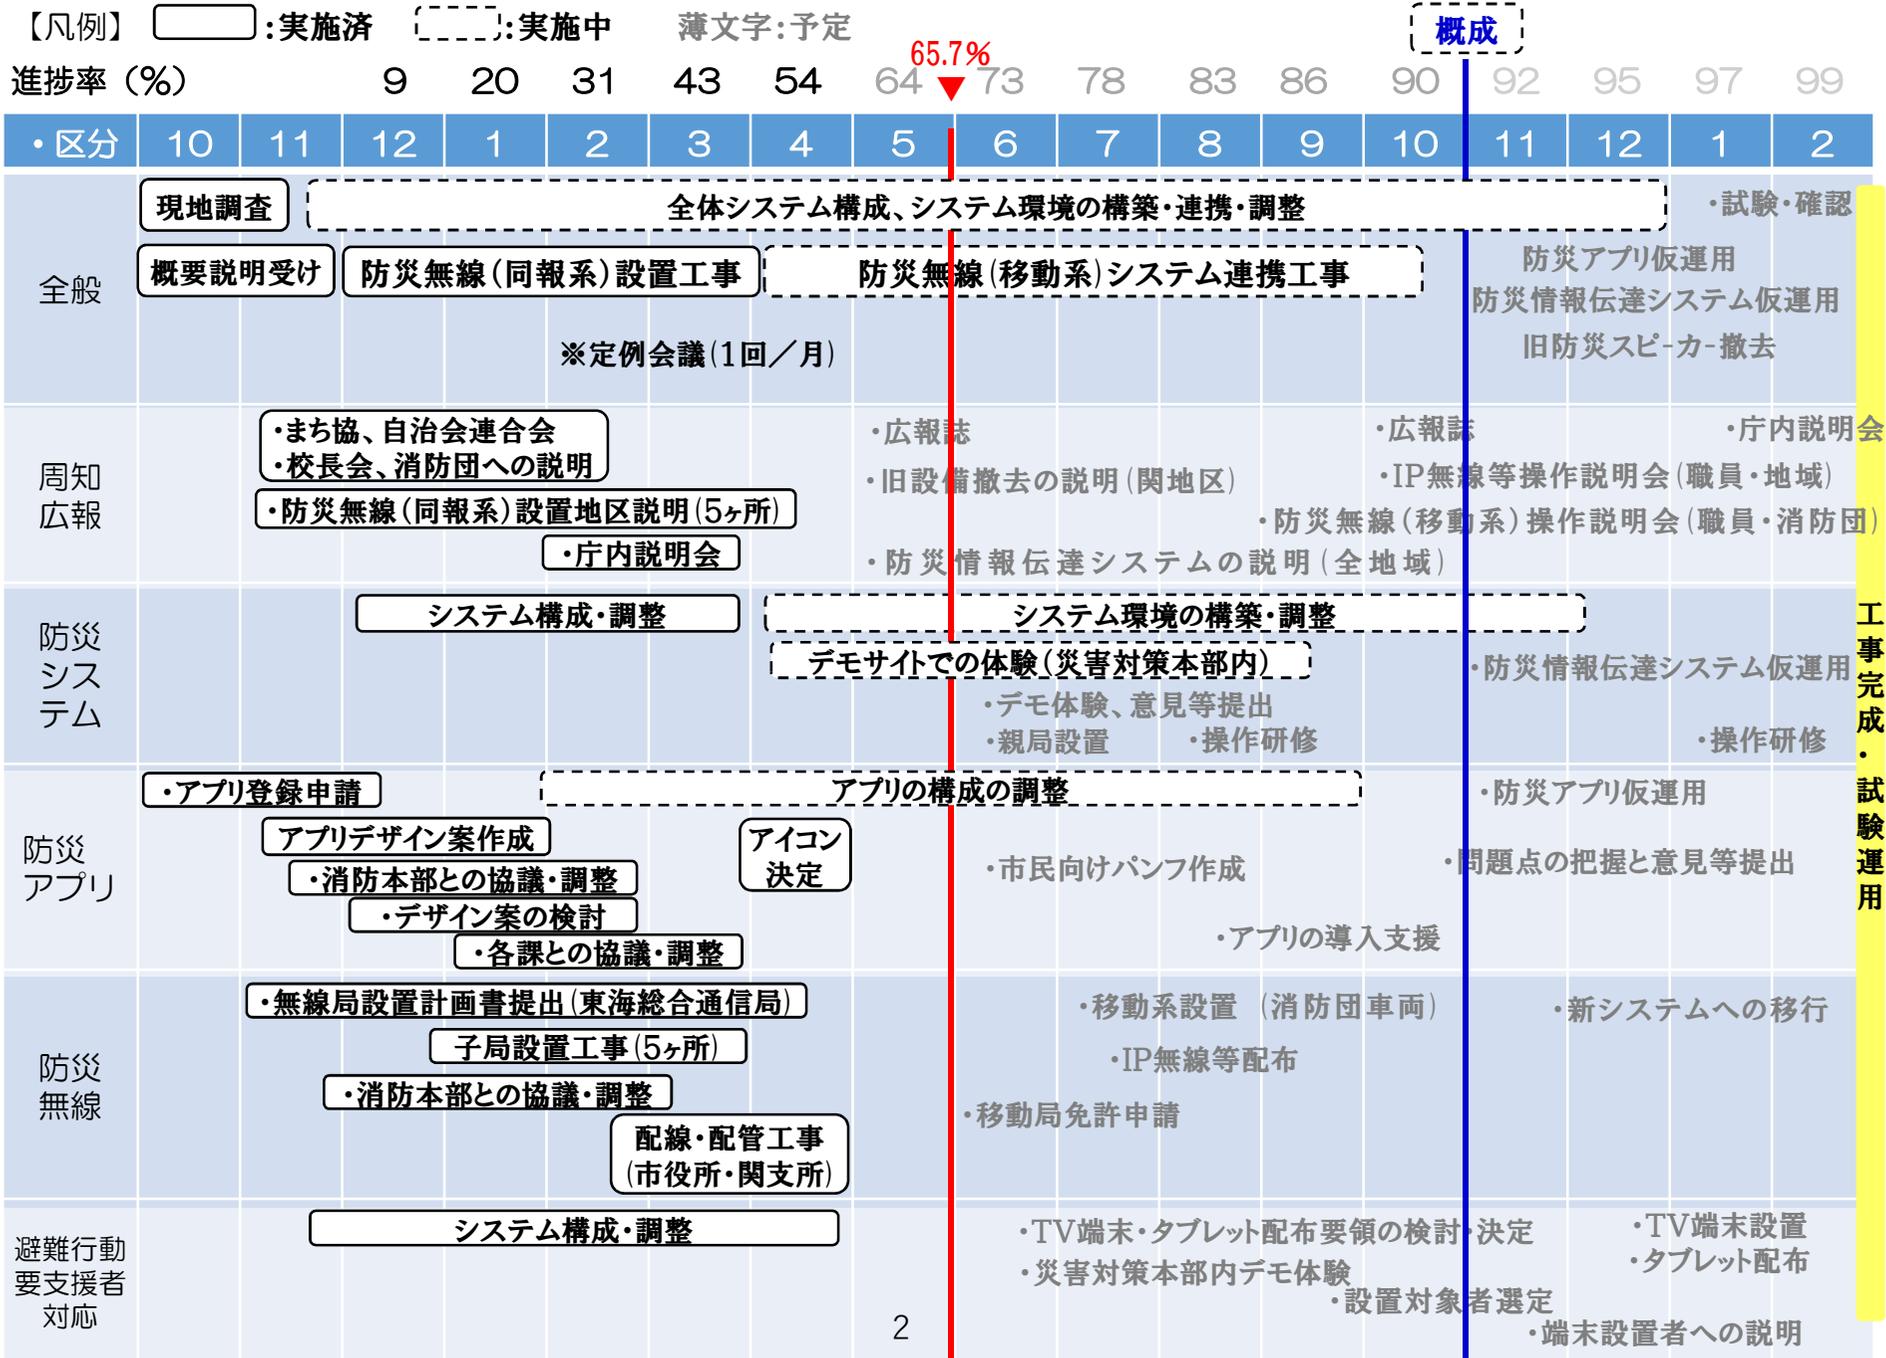

亀山市防災情報伝達システム（全体イメージ図）

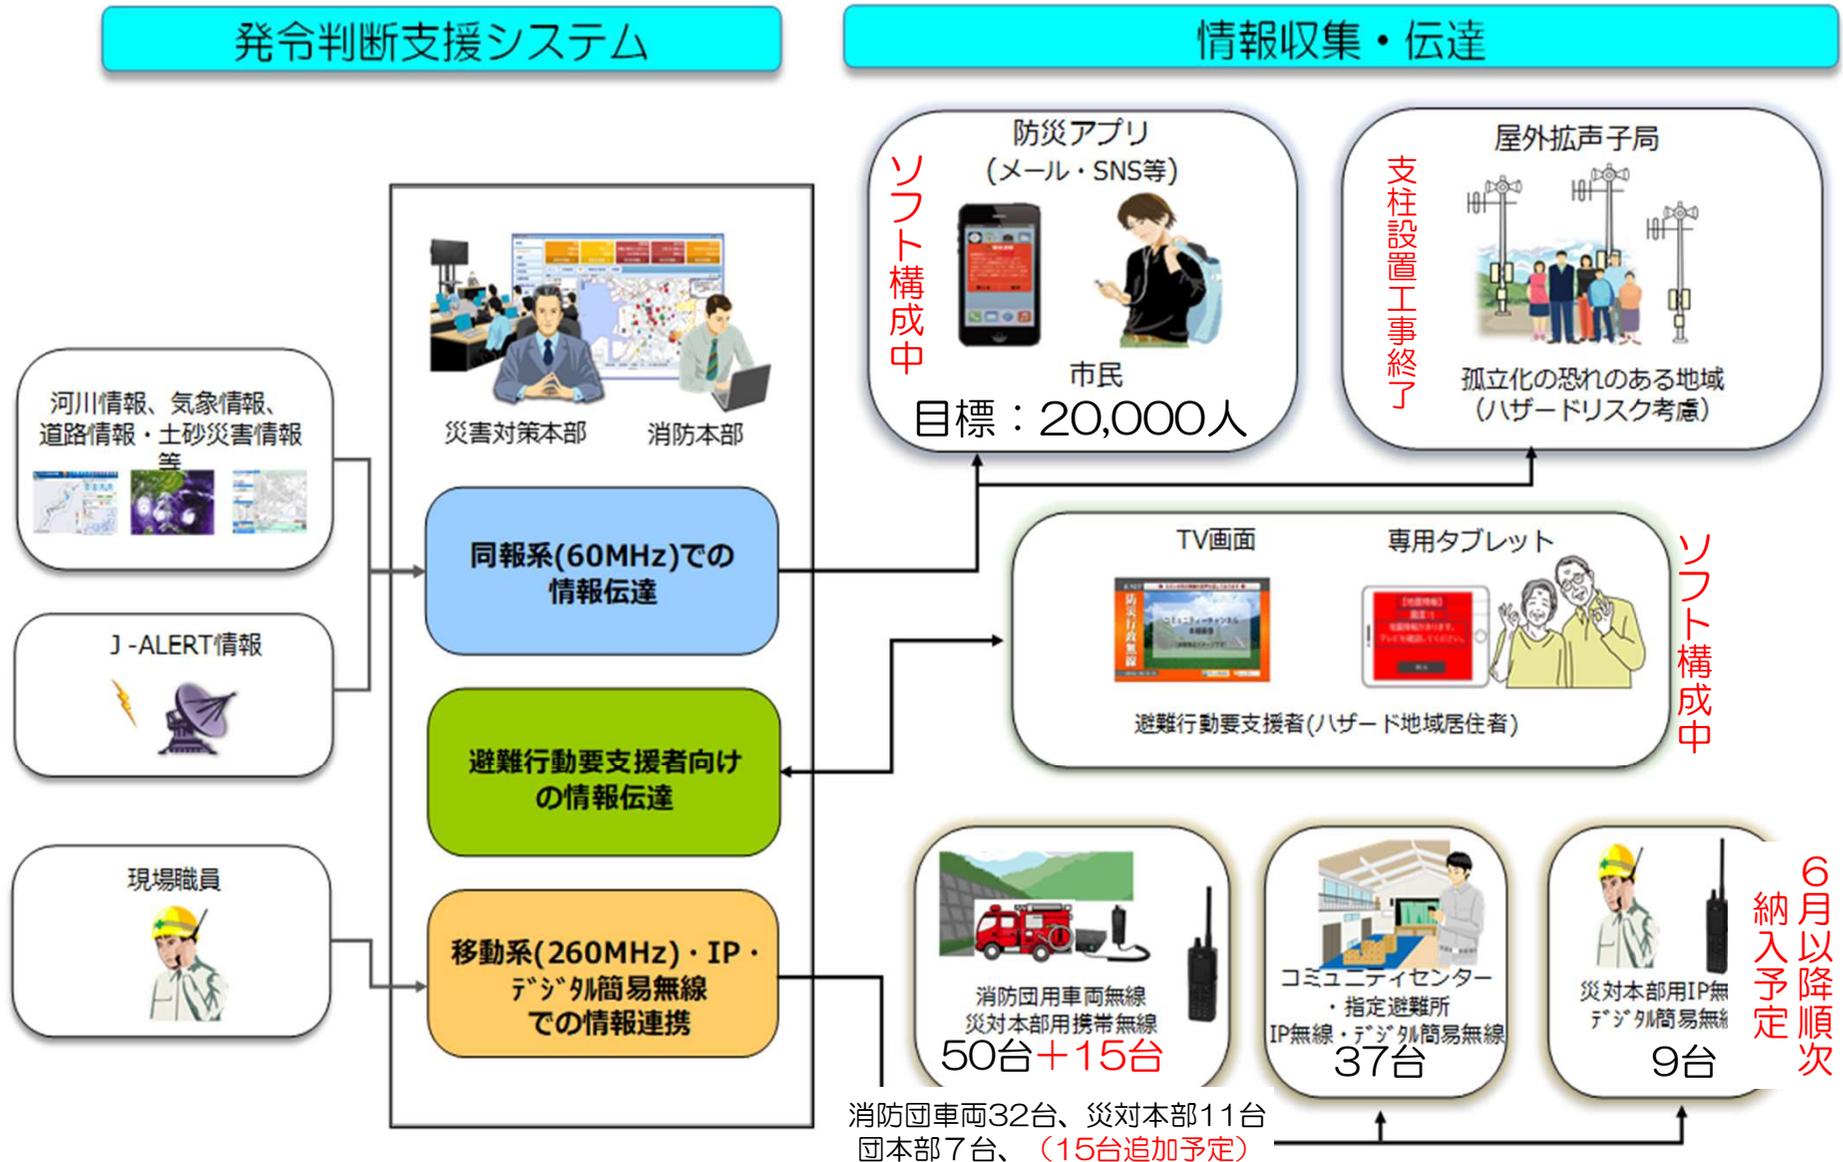

防災情報等収集伝達イメージ図

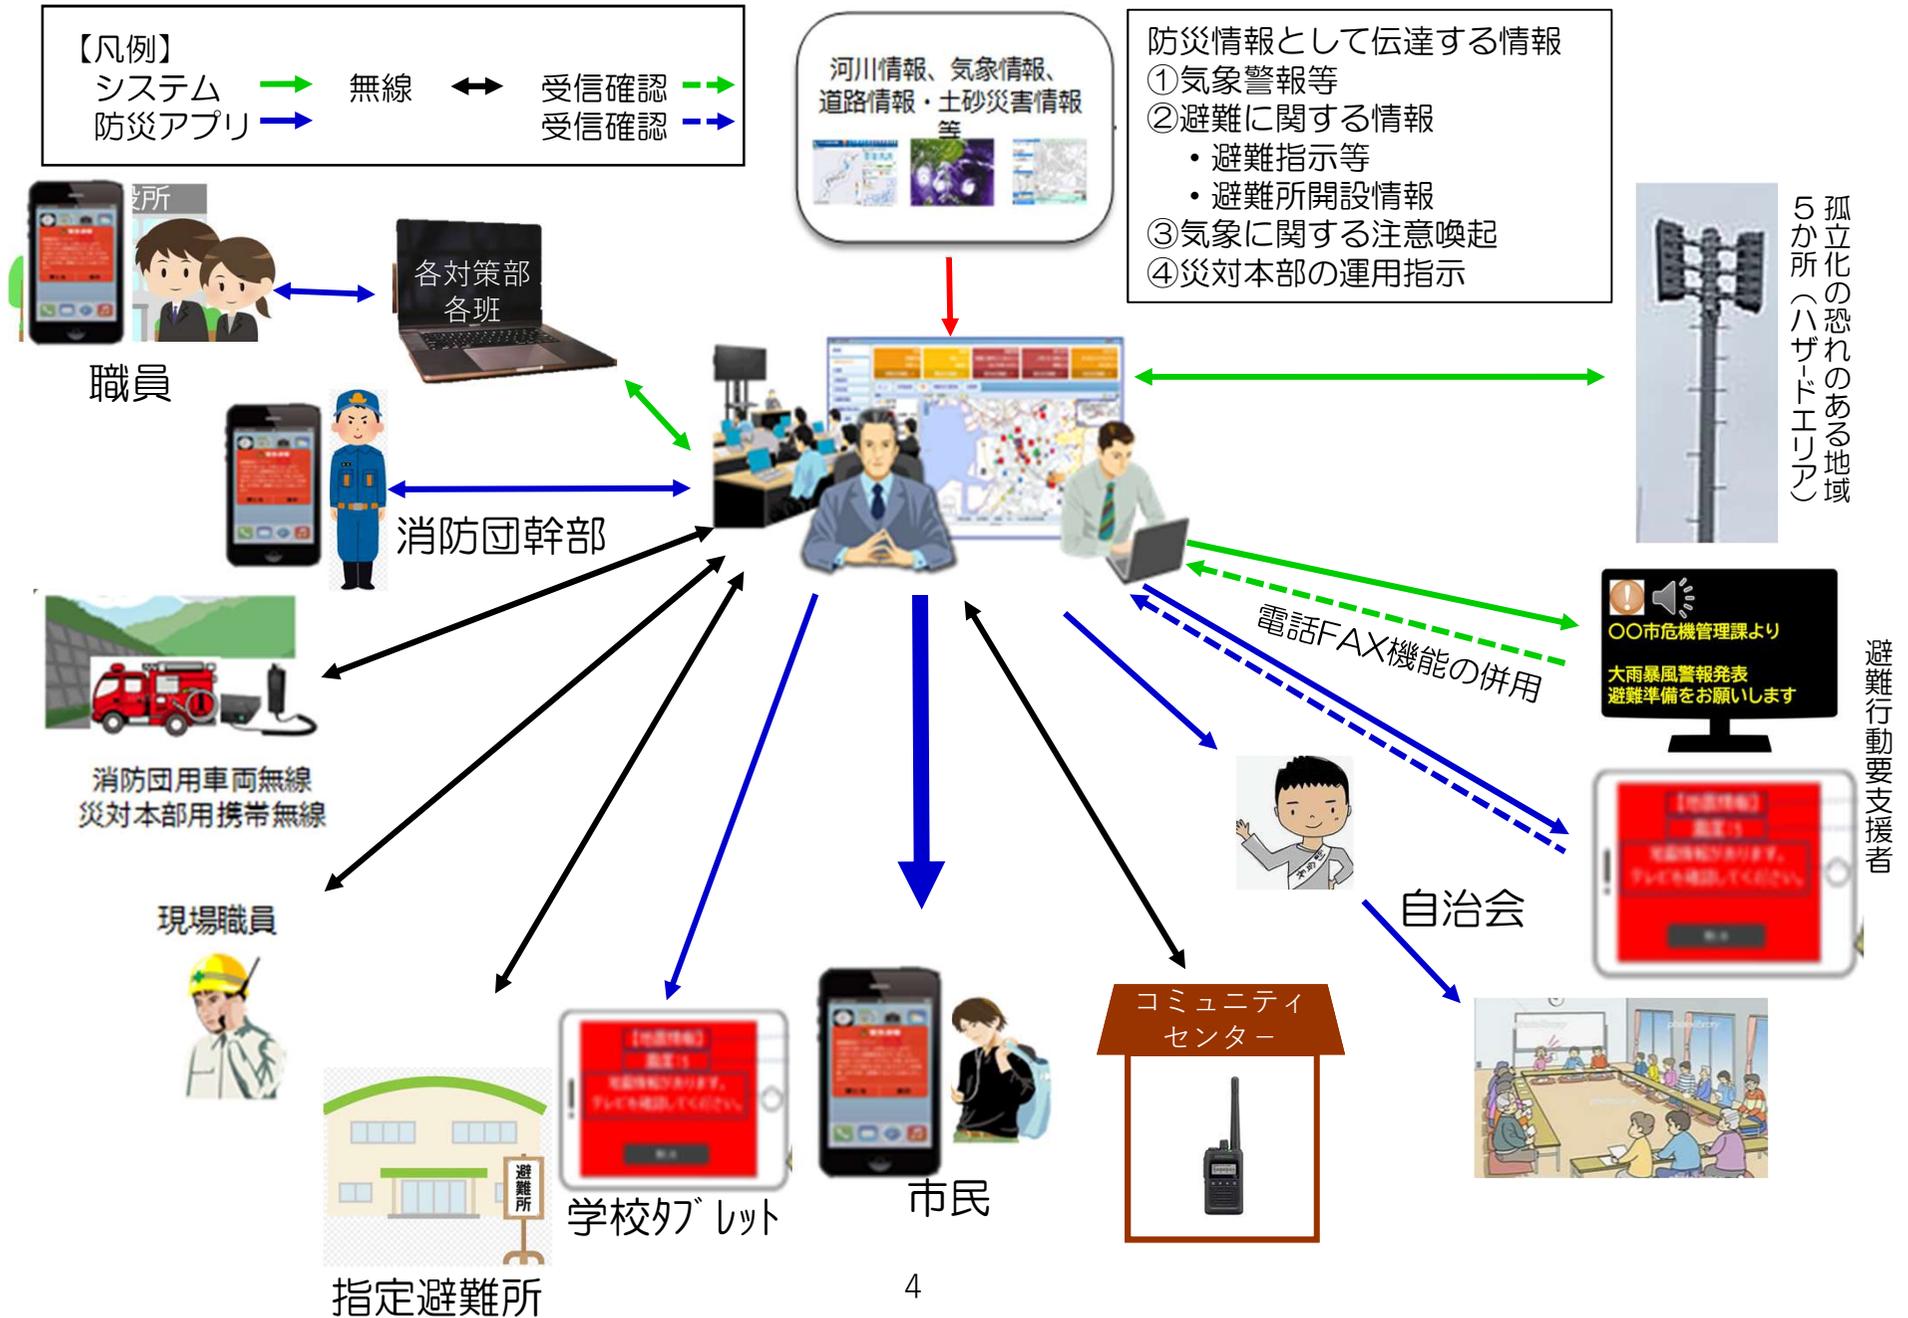

防災アプリ構成の概要について（イメージ図）

機能：<市民>Jアラート、気象警報の伝達、自治会等内での情報発信(返信機能なし)
 <職員>各職員への情報伝達(返信機能あり)・消防団幹部への情報伝達(返信機能あり)



履行報告調書

工事件名: 亀山市防災情報伝達システム整備工事

65.696%

自 令和 6 年 9 月 30 日 日本電気株式会社 東海支社
至 令和 8 年 3 月 6 日 令和 7 年 5 月 31 日現在

	工事進捗状況				令和6年				令和7年												令和8年			進捗率	備考
	工事構成比率(%)	先月まで進捗率(%)	当月進捗率(%)	累計進捗率(%)	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
機器費	①総合防災卓	28.36 %	20.255 %	4.051 %	24.306 %																				
	②遠隔制御	1.090 %	0.849 %	0.121 %	0.970 %																				
	③屋外子局等設置	14.57 %	10.926 %	1.214 %	12.140 %																			100.0%	
	⑤DX化(発令判断システム)	9.33 %	4.665 %	0.933 %	5.598 %																				
	⑥防災行政無線(移動系)	7.29 %	4.050 %	3.240 %	7.29 %																			90.0%	
	⑦デジタル簡易無線	0.61 %	0.305 %	0.305 %	0.61 %																				
	⑧IP無線	2.92 %	2.085 %	0.417 %	2.502 %																			80.0%	
	⑨避難行動要支援者情報伝達	9.40 %	2.892 %	0.723 %	3.615 %																				
	材料費	①総合防災卓	0.14 %	0.14 %	%	0.14 %																		70.0%	
③屋外子局等設置		1.84 %	1.84 %	%	1.84 %																				
労務費	①総合防災卓	0.95 %	0.408 %	0.136 %	0.544 %																		60.0%		
	③屋外子局等設置	3.43 %	2.772 %	%	2.772 %																		50.0%		
	⑥防災行政無線(移動系)	1.46 %	0.0 %	%	0.0 %																		40.0%		
	⑦デジタル簡易無線	0.03 %	0.0 %	%	0.0 %																				
	⑧IP無線	0.07 %	0.0 %	%	0.0 %																				
撤去費	④旧設備撤去	6.03 %	0.0 %	%	0.0 %																				
	共通仮設費	1.00 %	0.231 %	0.077 %	0.308 %																		30.0%		
	現場管理費	4.28 %	1.204 %	0.301 %	1.505 %																				
	技術者間接費	1.08 %	0.439 %	0.063 %	0.502 %																		20.0%		
	機器管理費	3.83 %	0.0 %	%	0.0 %																				
	一般管理費率分	2.3 %	0.923 %	0.133 %	1.055 %																		10.0%		
		%	%	%	%																				
合計		100 %	53.985 %	11.714 %	65.696 %																		0.0%		
			予定進捗率			0.0%	0.195%	0.390%	9.468%	19.570%	31.469%	43.368%	54.343%	64.658%	73.826%	78.525%	83.224%	86.936%	89.654%	92.372%	95.090%	97.808%	99.803%	100%	
			実施進捗率			0.0%	0.195%	0.390%	9.468%	19.570%	31.469%	43.368%	53.985%	65.696%											

----- 出来高 予定
————— 出来高 実施

亀山市 防災安全課 防災安全グループ

摘要:
